

INFORME DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD LES CORTS 2008-2011

1r i 2n SEMESTRE 2008



Consell Plenari districte Les Corts
4 de desembre de 2008



ÍNDEX

	PÀGINA
1. INTRODUCCIÓ	3
2. VALORACIÓ QUANTITATIVA DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD	4
3. VALORACIÓ QUALITATIVA DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD	7
4. CONCLUSIÓ	28

1. INTRODUCCIÓ

A continuació, presentem l'informe de l'Estat d'Execució del Pla d'Actuació del districte (PAD) de Les Corts 2008-2011.

Aquesta anàlisi de les línies i mesures, aprovades pel Consell Plenari del districte el passat mes de desembre de 2007, correspon a la valoració tant quantitativa com qualitativa de tot l'any 2008, és a dir tant el primer com el segon semestre d'aquest any.


S'han incorporat noves mesures no previstes al PAD, però al llarg d'aquest semestre s'han aprovat com són:

- Nou espai de joves al barri de la Maternitat-Sant Ramon
- Escola bressol Municipal dintre del Ceip Barcelona
- Llar residència per a persones amb discapacitat al C. Anglesola

El resultat del document de l'anàlisi del PAD Les Corts, 1r i 2n semestre 2008, es presenta amb un total de 6 Línies i 190 mesures.


2. VALORACIÓ QUANTITATIVA DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD 1r i 2n SEMESTRE 2008

1. BENESTAR I COHESIÓ TERRITORIAL

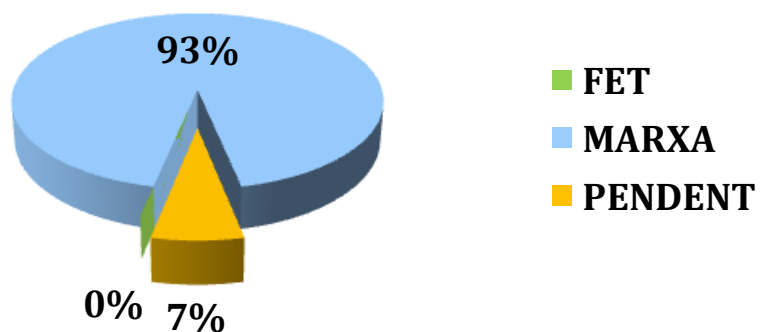


De l'àrea de Benestar Social i Cohesió Territorial estan en marxa 28 mesures, 2 estan pendents i 0 de finalitzades

2. MEDI AMBIENT

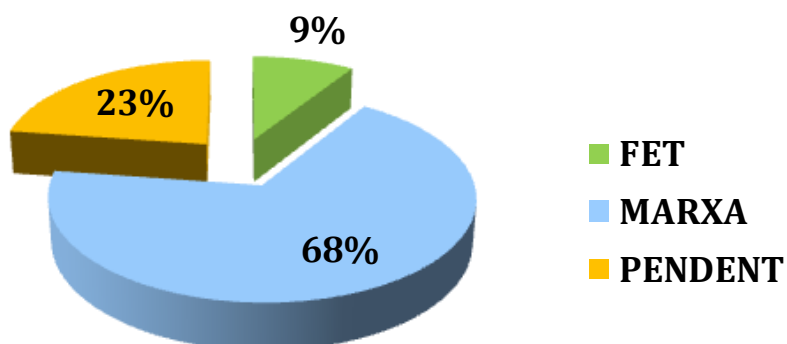


De l'àrea de Medi Ambient estan en marxa 15 mesures, 5 estan pendents i 2 de finalitzades

3. HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

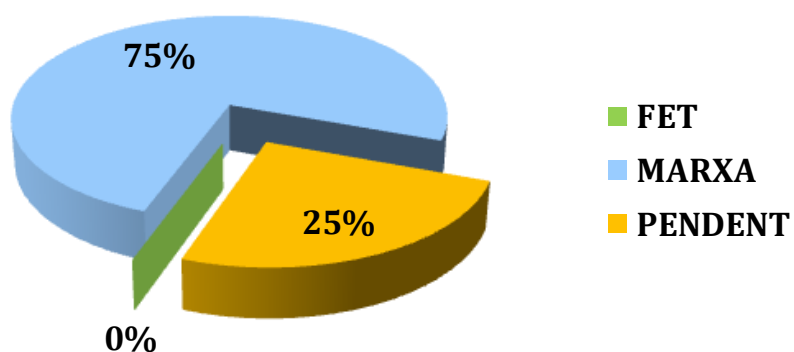


*De l'àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica
estan en marxa 12 mesures, 4 estan
pendents i 0 de finalitzades*

4. HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR

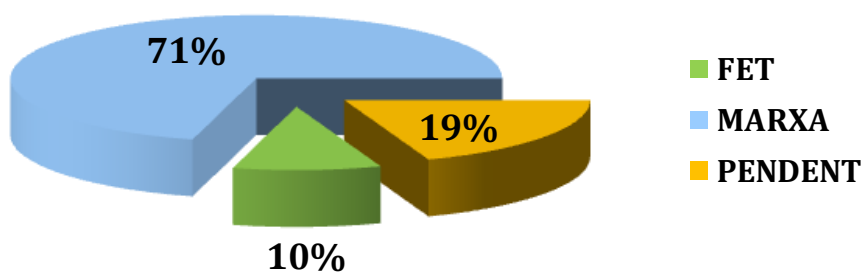


*De l'àrea d'Habitatge i Urbanisme i Règim
Interior estan en marxa 51 mesures, 14
estan pendents i 7 de finalitzades*

5. ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

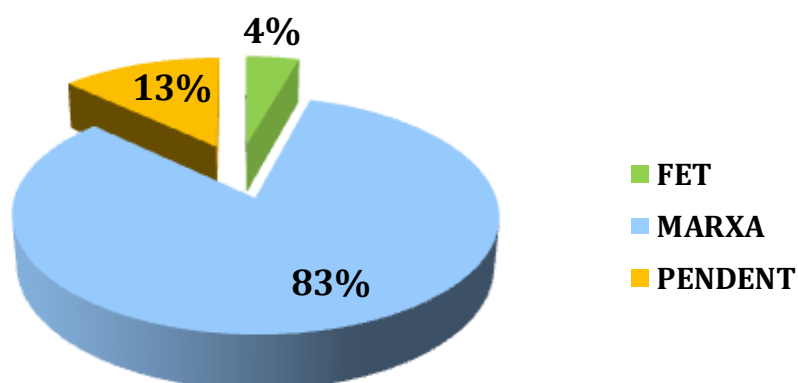

De l'àrea d'Acció Social i Ciutadania estan en marxa 19 mesures, 3 estan pendents i 1 de finalitzada

6. SEGURETAT I PREVENCIÓ

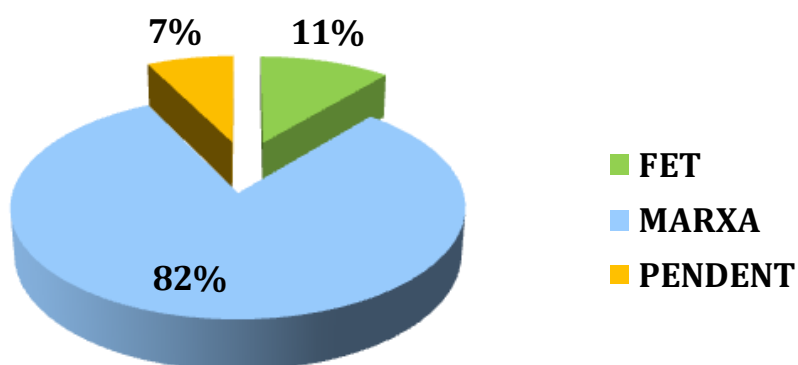

De l'àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat estan en marxa 22 mesures, 2 estan pendents i 3 de finalitzades

3. VALORACIÓ QUALITATIVA DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD 1r i 2n SEMESTRE 2008

1 Benestar i Cohesió territorial (Educació, Cultura i Benestar)

Educació

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.18	1	1	Nous canals per tal de què les escoles enforteixin les entitats de voluntariat aquestes facilitin educació en valors	2/2010				S'ha treballat el projecte "Bons Veïns Millor Barni" en quatre escoles públiques del districte. Està en marxa la coordinació per a un treball conjunt del Consell Escolar del districte amb el Consell de Cooperació.
1.19	1	2	Difondre oferta activitats socials del Dte. als centres educatius	2/2009				Finalitzats els treball interns a nivell tècnic i s'han començat les reunions amb CEIPS per tal de concretar propostes
1.20	1	3	Fer Catàleg de tots els centres del Dte.	1/2011				Es troba en la fase inicial dels treball interns a nivell tècnic
1.21	1	4	Estudi tècnic per millorar la seguretat a les sortida-entrada a les escoles	2/2010				Ha finalitzat la 1a fase, amb les inspeccions de totes les escoles i està en procés d'elaboració l'estudi tècnic de la millora de la seguretat en les sortides-entrades a les escoles.
1.22	1	5	Grup de treball en el Consell Escolar pel seguiment de l'absentisme escolar	1/2011				Constitució de les Comissions Socials als IES del districte. Presentació Pla d'Absentisme a les Corts gener/juny 2009
2.14	1	6	Obertura de patis escolars fora d'horari lectiu	1/2011				Finalitzat la redacció de projecte i s'han portat a terme sessions de treball amb les entitats per coordinar activitats. Està en marxa l'edició guia d'activitats i recursos curs 2008/2009. Obertura pati d'escola prevista el proper 13/12/08
10.19	1	7	Concretar al Consell Escolar els nous camins escolars a implantar	1/2011				Pendent de revisió i reunió amb els centres per a la implantació de nous Camins Escolars

Dones

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.10	1	8	Reforçar el PIAD amb nou programa de difusió	4/2009				Inclusió del PIAD a la web Districte i del Centre Cultural. Està en marxa l'estudi del projecte per fer difusió del PIAD
1.11	1	9	Difusió sobre l'eradicació de la violència de gènere	4/2010				S'han realitzat les convocatòries del Circuit contra els maltractaments i s'està treballant amb les convocatòries del mateix cara el 2009
1.34	1	10	Incloure perspectiva de gènere a les polítiques del districte	1/2011				S'ha començat el treball intern previ a nivell tècnic de disseny del projecte
1.35	1	11	Potenciar programes de formació en TIC	1/2011				S'ha finalitzat el curs "Dones i Internet a les Corts" i s'està avaluant les dinàmiques del 2008 i programant de noves pel 2009

Joventut

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.1	1	12	Crear Punt d'Informació Juvenil	2/2010					Definida la ubicació del Casal de Joves i s'està elaborant el plec de condicions, amb l'objectiu de poder avançar la seva implantació en el segon semestre 2009
1.3	1	13	Treball en xarxa de les entitats joves	1/2011					Realitzades varies reunions amb les entitats del Casal de Joves i estan en marxa les reunions pel carnaval amb les entitats.
1.4	1	14	Signar Acord de col·laboració entre les entitats de la Plataforma	2/2009					Estan en marxa les reunions amb la Plataforma per a treballar en un esborrany d'Acord en coordinació amb el CJB
1.5	1	15	Difusió, coneixement i desenvolupament dels projectes i activitats de les entitats juvenils i entitats del lleure	4/2008					Signat acord amb l'IES Ausiàs March. S'està informant als IES del nou servei de Joventut i que la Direcció central de Joventut assumirà aquest servei per tota Barcelona.
1.6	1	16	Impulsar nou habitatge de lloguer per a joves	1/2011					De moment no s'ha iniciat cap planejament que permeti impulsar la previsió de nou habitatge per a joves
nou			Nou espai per a joves al Barri de la Maternitat-Sant Ramon	4/2009					Amb la implantació del Nou Model de Serveis Socials bàsics de Barcelona, que implica el trasllat del Centre de Serveis Socials al nou local de Trav. De Les Corts 122, ha permès programar ubicació en el local de Trav. De Les Corts, 94. Un nou espai per a Joves a com a extensió del Casal de Joves.

Cultura

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.3	1	17	Consolidar la Comissió de Lectura Pública	1/2011					S'ha donat suport a una obra de teatre (Mirall trencat), invitacions a les escoles i en procés de gravar un CD per donar-los als centres de Secundària de les Corts
14.6	1	18	Difondre el patrimoni històric i cultural del districte	1/2011					Fet el tractament documental i les activitats pedagògiques. En marxa les publicacions
15	1	19	Recuperar la memòria històrica donant compliment a la llei	1/2011					Continua en tràmit el procés de retirada al Monument Primo de Rivera de l'Av. Josep Tarradellas (el desmuntatge està adjudicat i només resta pendent l'inici dels treballs de l'informe final de la Comissió d'Escultures que ha sol·licitat com a darrer tràmit, previ a l'enderroc, la redacció d'una ressenya històrica, que ja està encarregada).

Participació ciutadana

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.1	1	20	Enfortir els consells sectorials	1/2011				S'està realitzant una diagnosi dels òrgans de participació del districte amb l'objectiu potenciar-los.
12.2	1	21	Potenciar els òrgans de participació del districte, impulsant un treball en xarxa	4/2010				S'està treballant amb un treball en xarxa entre les entitats amb el fi d'enfortir els diferents mecanismes de participació del districte
12.5	1	22	Diagnosi de situació i necessitats del teixit associatiu	2/2009				S'ha realitzat l'estudi-diagnosi del teixit associatiu del districte i estan elaborant les conclusions i queda pendent l'execució de les mateixes.
12.7	1	23	Impulsar els Consells de Barri	2/2009				S'està treballant a nivell tècnic i col·laborant amb el Sector de Serveis General en el marc de les revisions recollides en la Mesura de Govern
12.8	1	24	Crear la Comissió de Municipis Limitrofs (municipis i districtes)	1/2011				Es continua treballant en coordinació amb els Municipis limitrofs projectes d'interès comú com els carrils bici d'Esplugues i altres
12.9	1	25	Aprovar reglament de funcionament dels Consells sectorials i comissions de treball	4/2010				Es continua treballant a nivell tècnic amb una proposta de Reglament tipus (una vegada analitzats diferents models existents a nivell de ciutat i d'altres districtes).
12.10	1	26	Millorar sistema de convocatòria a les sessions participatives del districte (web)	4/2009				S'està treballant amb el disseny de nous formats de convocatòria .
14.4	1	27	Donar a conèixer les entitats i els seus serveis a través dels mitjans municipals	1/2010				Difusió de 60 entitats i associacions en mitjans de difusió Municipals durant l'any 2008. Recerca de noves entitats
14.5	1	28	Difusió de les activitats de les entitats	1/2010				Estudi d'una pàgina Web Districte "Les Corts CC" per intentar treballar conjuntament. S'està treballant en un Pla de difusió per poder-ho presentar en el primer semestre 2009

Cooperació internacional

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
12.6	1	29	Consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació	1/2011				Es crea el Consell a l'anterior semestre i es convoca el Consell i la Comissió. Es realitza l'activitat i s'avalua molt positivament.

2 Medi ambient

Verd i biodiversitat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 08 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.2.5	2	1	Estudiar i revisar urbanització Jardins Vicens i Vives, per fer-lo accessible	4/2009					S'està treballant en la definició final del projecte conjuntament amb Parcs i Jardins
9.2.1	2	2	Disseny participatiu del futur Can Rigal	4/2010					S'ha començat les primeres reunions amb BIMSA per a encarregar-li la redacció del projecte
9.2.2	2	3	Nou hort urbà i zona verda a Av Pearson	1/2008					Finalitzat en el 2n semestre 2008
9.2.3	2	4	Trasllat i millora de l'hort urbà Torre Melina	4/2008					Finalitzat en el 2n semestre 2008
9.2.4	2	5	Millora zona verda entorn Monestir de Pedralbes	4/2009					
9.2.5	2	6	Millora del verd al voltant pl. Sòl de Baix	4/2009					
9.2.6	2	7	Recuperar espai públic dels Campus Universitaris	4/2009					Reunions amb U.B. i U.P.C. Concreció espais i s'estan redactant els projectes de millora dels c. Baldiri i Reixac i C. Pascual i Vila
9.2.7	2	8	Millora entorn antic Monument als Caguts	4/2009					Concreció actuacions, en fase de redacció de projecte d'obres.
9.2.8	2	9	Millora Jardins Goday i Casals	4/2010					En fase de redacció de projecte per Parcs i Jardins
11.6	2	10	Creació de nova àrea d'esbarjo pels gossos	4/2011					Concretada la ubicació, està en fase de redacció de projecte per Parcs i Jardins

Manteniment i Neteja

Neteja i recollida

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 08 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.3	2	11	Desenvolupar un nou Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic i millora del mobiliari i arbrat	1/2011					S'han concretat 23 actuacions integrals en el districte que incorporen: renovació enllumenat, soterrament de línies elèctriques, renovació del clavegueram, millores d'accessibilitat, arbrat, voreres i calçada, pavimentació i millores en parcs.

Recursos i reciclatge

Consum i estalvi

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 08 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
7.1	2	12	Campanya per la reducció del consum elèctric i estalvi d'aigua	1/2011					S'han distribuït estalviadors a la Mostra Entitats '08 i està en funcionament l'estudi mesures reducció consum en equipaments municipals
7.2	2	13	Bombetes de baix consum a l'enllumenat de Nadal	1/2011					S'està redactant l'informe per part d'enllumenat.

Residus									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 08 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.1.4	2	14	Revisar les ubicacions dels Punt Verd Mòbil	4/2009					S'està executant una anàlisi de les ubicacions en el marc de la Nova contracte de Neteja
10.2.1	2	15	Estudi per implantar recollida pneumàtica	1/2011					
10.2.2	2	16	Revisar recollida selectiva al Casc antic	4/2008					Fet plànol localització. Calendari recollida i en marxa Redacció proposta
10.2.3	2	17	Posar punts de recollida selectiva d'objectes petits als CC, biblioteques, etc	4/2009					S'ha arribat un acord amb el Punt Verd i s'està treballant la informació pels centres.
10.2.4	2	18	Revisar i ampliar, si s'escau, freqüència buidatge de papereres	4/2008					Estudi Sector Neteja

Sensibilització i Agenda 21									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 08 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.1.1	2	19	Difusió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Ag 21)	4/2010					
10.1.2	2	20	Desplegar el programa d'Oficina Verda	1/2011					Aprovat el Pla interdepartamental de medi ambient de districte 2009-2011 per l'equip de gerència
10.1.3	2	21	Impulsar l'Ag 21 Escolar	4/2009					Previst mantenir reunió amb direccions dels CEIPs
10.1.5	2	22	Treballar amb les entitats el desenvolupament sostenible de la Festa Major	1/2011					2 activitats sostenibles amb 2 caps de barri de Festa Major

3 Hisenda i Promoció econòmica (Promoció Econòmica)

Promoció econòmica i ocupació

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
5.1	3	1	Recursos per la orientació laboral i professional, demanant i impulsant una OTG al dte.	1/2011					

Comerç i Mercats municipals

Comerç i consum									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
4.1	3	2	Consolidar l'eix comercial Sants-Les Corts	1/2011					Realitzada la presentació de l'organigrama eix i en marxa el Pla de treball de les comissions
4.2	3	3	Suport a les activitats de les associacions de comerciants	1/2011					Portada a terme l'acció comercial directe Entitat i estan en marxa algunes accions comercials entitats
4.3	3	4	Vetllar per un impacte comercial positiu del futur projecte Barça	1/2011					Es treballarà en el marc de la Comissió de Seguiment del Projecte del Barça on queda garantida la presència de membres representants de les associacions de comerciants
4.4	3	5	Potenciar l'associacionisme comercial i el petit comerç de barri (Casc Antic)	1/2011					Realitzat l'estudi de l'activitat econòmica del casc antic i s'estableixen contactes amb comerços per tal d'incentivar l'associacionisme
4.5	3	6	Fer Plànol Comercial i Turístic del Dte.	2/2010					Establert el contacte amb l'Empresa i s'està treballant amb la definició completa del projecte.
4.6	3	7	Impulsar la Campanya de Normalització Lingüística de Comerços	1/2011					Realitzat el contacte amb els comerços i es treballa amb la captació de nous socis.
4.7	3	8	Reforçar i promoure iniciatives innovadores dels centres comercials	1/2011					Aportació d'una nova activitat a la Festa Major del dte. i està en marxa el Quiosc atenció ciutadà on line i l'estudi noves propostes campanya nadal
4.8	3	9	Integració del comerç regentat per immigrants	1/2011					
4.9	3	10	Impulsar el nou eix comercial Europa-Anglesola	1/2011					
4.15	3	11	Recull fonts bàsiques d'ajut al comerç (guia)	1/2011					Iniciada la recerca i recull d'ajuts al petit comerç

4.10	3	12	Millora de lla neteja, enllumenat, a recollida d'escombreries als eixos comercials	1/2011				Canalitzades les demanades puntuals
4.11	3	13	Millorar i ampliar les zones de càrrega-descàrrega	1/2011				En marxa la revisió i estudi del projecte
4.12	3	14	Promoure el comerç just i sostenible	1/2011				
4.13	3	15	Revisar Pla d'Usos per evitar concentració sectorial	4/2009				S'ha efectuat una anàlisi de la situació actual i s'ha elaborat una proposta d'adequació i modificació del Pla d'Usos existent que serà presentada en la propera Comissió de treball d'Urbanisme del mes de desembre.

Mercats

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
4.14	3	16	Potenciar el mercat de Les Corts i les seves activitats	1/2011				Implicació en la F.Major del districte i es treballa amb nous projectes conjunts

4 Habitatge, Urbanisme i Règim interior (Urbanisme i Infraestructures)**Habitatge i Paisatge urbà**

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.4.1	4	1	Política Construcció habitatge de protecció i reallojament . Desenvolupament PERI EUROPA- ANGLESOLA	1/2011					1. En fase de redacció del projecte i tràmit de llicència de l'edifici de reallojament.2. Aprobat definitivament el projecte d'urbanització de tot l'àmbit, prevista l'execució de la 1a fase 2009-2010. 3.En fase de redacció el projecte de la nova Escola Bressol i s'ha concretat els equipaments a situar a l'àmbit del c. Anglesola (nou centre Serveis Socials i llar residència disminuïts). 4. S'han enderrocant les finques que han quedat buides
8.4.2	4	2	Política Construcció habitatge de protecció i reallojament . Desenvolupament PERI COLÒNIA CASTELLS	1/2011					1.En construcció l'edifici de reallojament.2. Aprobat definitivament el Pla especial de l'àmbit d'Entença-Montnegre. 3. En fase de redacció de projectes dels edificis de la 2a fase
8.4.3	4	3	Política Construcció habitatge de protecció i reallojament . Desenvolupament PERI BACARDI	1/2011					1. Construcció edifici habitatge de reallojament executat i ocupat. 2.En tràmit de redacció el projecte d'urbanització . 3. Iniciat el procediment d'expropiació de la darrera fase (zona verda) del Peri.
14.3	4	4	Creació de Oficina Habitatge	2/2009					Prevista l'apertura de l'Oficina al C. Numància 101, el proper 7 de gener de 2009

Urbanisme i Obres				Urbanisme i Infraestructures					
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.2.1	4	5	Arranjament Pl. Can Rosés	4/2009					Adjudicada la redacció del projecte
8.2.2	4	6	Arranjament Pl. Dr. Ignasi Barraquer	1/2009					
8.2.3	4	7	Arranjament Zona Entença- Av. De Sarrià	4/2009					En marxa l'estudi de Parcs i Jardins
8.2.4	4	8	Col·laborar Dte. Eixample per retirada monument a José Antonia Primo de Rivera i la seva reurbanització	3/2008					Coordinació amb l'Eixample, el desmuntatge està adjudicat i estava pendent de passar a la comissió d'escultures i es recullen les últimes ressenyes històriques per així procedir al seu enderroc.
8.5	4	9	Actualitzar Mapa Fibra Òptica	4/2009					En marxa informe xarxa existent
9.3.2	4	10.1	Continuar expropiacions: PERI Bacardí	4/2011					1. S'han expropiat i enderrocats totes les finques corresponents a l'àmbit d'equipaments de la futura Residència i Centre de dia per a la gent gran. 2. S'han expropiat i enderrocats totes les finques corresponents a l'àmbit del 18 i està construït i ocupat l'edifici d'habitatges de real·lotjament. 3. Les finques del c. Benavent 36bis, 38 i 40 ja s'han expropiat i enderrocats. 4. Estan en tràmit d'expropiació les finques del c. Benavent 28-34, 34 i 36 corresponents a la zona verda (última fase d'execució del Peri)
9.3.1	4	10.2	Continuar expropiacions: C. Danubi (de Trav. De Les Corts a C. Cardenal Reig)	4/2011					
9.3.3	4	10.3	Continuar expropiacions: Trav. De Les Corts - Av. St Ramon.	4/2011					
14.2	4	11	Garantir informació als afectats dels plans urbanístics	1/2011					Es continua treballant en el marc de les corresponents Comissions de Seguiment i Comissions de treball.
6.1.1	4	12	Portal del Coneixement. Campus Diagonal Sud	1/2011					Executada la senyalització (6.08) i signat el conveni (7.08) i s'està treballant en: seguretat, mobilitat i obres.
6.1.2	4	13	Portal del Coneixement. Campus Diagonal Nord	1/2011					Signat el conveni (7.08). Està en execució la senyalització i s'està treballant en: seguretat, mobilitat i obres.
6.1.3	4	14	Campus Portal de coneixement: Millora i obertura dels pavellons Güell i resta d'elements Gaudí	1/2011					S'està treballant amb els veïns i veïnes.

Les Corts									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.1	4	15	Urbanització i millora c/ Novell (entre Vallespir i Guitard)	4/2009					Obres en execució
8.1.2	4	16	Urbanització i millora c/ Caballero (entre Guitard i Nicaragua)	4/2010					Projecte executiu redactat, pendent inici procediment de licitació per iniciar obres 2009
8.1.3	4	17	Urbanització i millora c/ Evarist Arnús (entre Vallespir i Guitard)	4/2009					Obres en execució
8.1.5	4	18	Urbanització i millora c/ Taquígraf Martí (de Joan Guell a Galileu)	4/2010					Redactat el projecte executiu
8.1.6	4	19	Urbanització i millora Travessera de les Corts (d'Av. Sarrà a Numància)	1/2011					
8.1.7 i 8.1.4	4	20	Urbanització i millora c/ Taquígraf Garriga (d'Av. Sarrià a Numància).Urbanització i millora c/ Berguedà (entre Trav. Les Corts a Taquígraf Garriga)	4/2009					C. Taquígraf Garriga: Obres adjudicades. Inici Desembre C. Berguedà: Executant la urbanització i millora del carrer.
8.1.8	4	21	Urbanització i millora c/ Anglesola (a Dr. Ibáñez)	4/2010					Aprobat el projecte, pendent iniciar tràmit adjudicació
8.1.9	4	22	Urbanització i millora Av Madrid (entre Gran Via Carles III i Numància)	1/2011					
8.1.10	4	23	Reordenació c/ Prat d'en Rull (entre Travessera i Taquígraf Garriga)	4/2008					Obres en execució

La Maternitat i Sant Ramon									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.11	4	24	Urbanització i millora Ptge. Regent Mendieta (d'Av. Madrid a Regent Mendieta)	1/2011					Redactat projecte
8.1.12	4	25	Urbanització i millora c/ Comte Güell (de Trav. Les Corts a Av. De Madrid)	4/2009					Obres en execució
8.1.13	4	26	Urbanització i millora c/ Emèrita Augusta (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz)	3/2009					Obres en execució
8.1.14	4	27	Urbanització i millora Ptge. Jaume Roig (d'Av. De Madrid a Felipe de Paz)	1/2011					Projecte redactat
8.1.15	4	28	Urbanització i millora c/ Salvador Cardenal (de Maternitat a Sabino de Arana)	4/2009					Obres en execució
8.1.16	4	29	Urbanització i millora c/ Menéndez Pelayo	4/2010					
8.1.17	4	30	Urbanització i millora c/ Martí i Franques	4/2010					Realitzat el Projecte executiu i en marxa l'adjudicació d'obres. Previst inici de les obres el gener de 2009
8.1.18	4	31	Estudi de confortabilitat i ús dels elements per a la millora al c/ Pintor Pahissa	4/2009					En marxa l'estudi

Pedralbes									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
8.1.19	4	32	Urbanització i millora c/ Jordi Girona (de Gran Capità a Tinent Coronel Valenzuela)	4/2009					Obres adjudicades pendent d'inici
8.1.20	4	33	Urbanització i millora Ptge. Ametllers (d'Ametllers a Av. Pearson)	1/2011					
8.1.21	4	34	Urbanització i millora zona Gran Capità (d'Av. D'Esplugues a Cavallers)	4/2010					
8.1.22	4	35	Connexió c/ Font del Lleó-Caterrera de les Aigües	4/2010					
Pla d'Equipaments									
Desenvolupar el pla d'equipaments									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
2.1	4	36	Actualitzar i aprovar PED	4/2010					Es continua treballant en la Comissió de Seguiment i el grup de treball: Validat el document de coneixement 1a fase i inici revisió dels documents d'anàlisi i escenaris de futur (2a i 3a fase)
2.22	4	37	Edició mapa-guia d'equipaments i serveis	1/2009					Elaborant la guia de serveis i equipaments del districte.

2.2	4	38	Impulsar construcció residència i centre de dia GG c/ Benavent	1/2011				CONVENI GENERALITAT 1-Assistència Comissió Seguiment equipaments de l'Ajuntament. 2- Informació al Ple del districte . En tràmit planejament i llicència
2.3	4	39	Impulsar construcció llar-residència malalts mentals c/ Equador	4/2010				CONVENI GENERALITAT 1-Assistència Comissió Seguiment equipaments de l'Ajuntament. 2- Informació al Ple del districte. Obres en execució
2.4	4	40	Impulsar construcció Centre salut mental i trasllat CAP Montnegre a c/ Equador	4/2010				CONVENI GENERALITAT 1-Assistència Comissió Seguiment equipaments de l'Ajuntament. 2- Informació al Ple del districte. Obres en execució
2.5	4	41	Nova biblioteca de districte c/ Comtes de Bell-lloc	2011				Fet el programa funcional i en marxa el programa de viabilitat
2.6	4	42	Nova ludoteca infantil c/ Guitard	4/2010				Redacció projecte. S'ha reperiodificat la inversió i s'ha traslladat 2009/2010
2.7	4	43	Obtenir i cedir sòl a la Generalitat per IES Europa-Anglesola	4/2010				En tràmit fase de gestió urbanística
2.8	4	44	Trasllat i ampliació escola bressol Xiroi a Europa-Anglesola	4/2009				En fase de redacció de projecte i pla especial
2.9	4	45	Impulsar trasllat i millora Escola educació especial Esclat a c/ Guitard	4/2008				Les obres, pràcticament, han finalitzat i s'està treballant en una solució provisional per a garantir l'accés.
2.10	4	46	Impulsar trasllat Escola Paideia	4/2009				Concretat l'emplaçament, i s'està treballant conjuntament amb l'Escola, Urbanisme i la l'UB en el projecte i el document de planejament
2.11	4	47	Recuperar Casa Hurtado com equipament	1/2011				
2.12	4	48	Recuperar edifici Telefónica C. Bordeus com equipament	1/2011				Es continua treballant entre Patrimoni i Telefónica
2.13	4	49	Nou edifici administratiu per ampliar Seu Dte.	4/2010				Aprobat definitivament el planejament, s'ha adjudicat l'arquitecte redactor i s'està treballant en la redacció del projecte executiu
2.15	4	50	Restauració i millora del Monestir de Pedralbes	4/2009				Executant obres de rehabilitació de l'Arxiu i Torre de Sant Rafael
2.16	4	51	Seguiment del futur projecte Barça enriqueixi la xarxa d'equipaments	4/2009				Es treballarà en el marc de la Comissió de seguiment del Projecte del Barça i de la Comissió del Pla d'Equipaments del Dte.
2.17	4	52	Impulsar una nova escola bressol a La Maternitat i San Ramon	4/2009				Es treballarà en el marc de la Comissió de seguiment del Projecte del Barça i de la Comissió del Pla d'Equipaments del Dte.
2.18	4	53	Estudiar la possible reubicació CAP La Maternitat	1/2011				Signat un nou Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat en data 8/10/2008, en el qual apareix el compromís de reserva d'espai per poder donar resposta a les previsions de necessitats futures amb un nou CAP a les Corts (ABS 4c) per a substituir a l'actual
2.19	4	54	Estudiar la possibilitat d'una pista d'skate al districte	1/2011				Concretada la ubicació entre Albert Bastardes-General Batet-Josep Sunyol i Av. Manuel Azarria. I està en estudi el projecte
2.20	4	55	Treballar per aconseguir la cessió a la ciutat de la Caserna del Bruc	1/2011				S'està portant a terme negociacions des dels serveis centrals. Aprovada i notificada al Ministeri de Defensa una moció en data 17/10/1007 per la qual, s'insta la devolució a la ciutat del quartel

2.21	4	56	Nova ubicació Casal de Joves	1/2011					Concretada la ubicació a Can Rosés
6.2	4	57	Acord amb les Universitats pel futur ús dels veïns i veïnes, de les instal·lacions esportives universitàries	4/2011					S'està treballant a la Comissió Universitats.
nou			Escola Bressol Municipal dintre Ceip Barcelona	4/2011					Fase de treball tècnica per a redacció del projecte
nou			Llar residència persones amb discapacitat al c. Anglesola	4/2011					Fase de treball tècnica per a redacció del projecte

Pla de millores dels equipaments

CODI PAD 2008-2011	codi mesura	mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
9.1.1	4	58	Reforma i millora del pavelló de l'Illa	4/2010				En marxa l'estudi
9.1.2	4	59	Gespa artificial al camp Aristides Maillol	4/2008				Obres en execució
9.1.3	4	60	Millora acústica i manteniment al CC Les Corts	1/2011				
9.1.4	4	61	Finalitzar rehabilitació i recuperació CC Can Deu	4/2008				Finalitzada mesura 1r semestre 2008
9.1.6	4	62	Millores dels Casals de la Gent Gran	1/2011				En marxa l'estudi de les necessitats
9.1.7	4	63	Revisió dels espais esportius escolars per facilitar si s'escala la seva obertura als esports d'equip	4/2009				Finalitzat el projecte de millora pista esportiva CEIP les Corts. I en revisió d'altres pistes esportives de centres escolars
nou			Trasllat i nova ubicació CSS Zona Oest per aplicació del nou model de Serveis Socials	4/2009				Compra local Trav. de les Corts, 122 i en fase de redacció de projecte
nou			Trasllat i nova ubicació CSS Zona Est per aplicació del nou model de Serveis Socials	4/2009				Lloguer local Can Bruixa 11 i en fase de Redacció de projecte

Règim interior

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
13	4	66	Treballar per desenvolupar l'Estatut del Conseller de Dte.	4/2008					Aprovat per Acord del Consell Plenari del 30/05/2008. Entra en funcionament 1 de gener del 2009
14.7	4	67	Presentar document de Seguiment de l'estat d'execució del PAD	desembre 2008					Presentant informe 2n semestre 2008

Atenció a la ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
14.1	4	68	Millorar atenció ciutadana potenciant mitjans telemàtics	2/2009					L'últim trimestre del 2008 s'està acabant de perfilar per millores les prestacions del quiosc (caixer) de tràmits on line. I com experiència pionera instal·lar-ho en el Centre Comercial de l'Illa, en el primer trimestre del 2009.

5 Acció Social i Ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.9	5	1	Creació de noves places de residència i centre de dia , i apartaments tutelats per a gent gran i habitatge dotacionals per a persones amb discapacitat	1/2011					Aprovació d'una nova llar residència per a persones amb discapacitat en l'àmbit d'equipaments d'Europa-Anglesola. En fase inicial de concreció del programa funcional
1.12	5	2	Programa de seguiment de persones que viuen soles en situació precària	1/2011					
3	5	3	Impulsar el pla comunitari juntament "Bons veïns, millor barri"	1/2011					Contractat Tècnic comunitari-Finalitzada la diagnosi i en marxa activitats a les escoles i a l'espai públic.
1.31	5	4	Promoure el voluntariat social a tots els àmbits	1/2011					

Infància

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.2.	5	5	Participació entitats en la millora dels serveis d'infància i projecte de nova ludoteca	1/2011					Definit el projecte educatiu de la nova ludoteca amb plataforma infantil.

Gent gran									
CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.7	5	6	Foment de l'activitat cultural per a la gent gran i de la tasca aules d'extensió universitària	1/2011					En marxa Nou projecte Programa Universitària per a la Gent Gran (Universitat Ramon Llull)
1.8	5	7	Treball en xarxa dels CGG a través del Consell	1/2011					Realitzades reunions amb les entitats de gent gran i estan en marxa les activitats campanya de Nadal i s'està redactant el butlletí de la Gent Gran
1.32	5	8	Activitats intergeneracionals (infants i gent gran)	1/2011					En marxa els projectes de continuïtat (festes intergeneracionals) . Programa Arxiu de l'experiència
1.25	5	9	Act. que integrin a la gent gran en grups potenciant actituds saludables	1/2011					Disseny nous projectes any 2009

Persones amb discapacitat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.13	5	10	Programa de sensibilització i coneixement dels diferents col·lectius amb discapacitats	1/2011					A novembre de 2008, s'han executat totes les accions previstes amb: 2 reunions del Consell Sectorial. Organització activitats de sensibilització Dia Internacional Persones amb Discap. A les Corts (03/12/08) i reunions (per temes) amb el conjunt d'entitats del sector. Presentació documental
1.14	5	11	Programa d'adaptació de barreres (espai públic i equipaments)	4/2010					En marxa la redacció de l'estudi
1.15	5	12	Itineraris de semàfors sonors	1/2011					S'està treballant en el marc del pla de millora de semàfors sonors ciutat de BCN.
1.16	5	13	Eliminació de barreres de comunicació principalment disminució auditiva en serveis públics	4/2009					En fase estudi tècnic
1.17	5	14	Pla de reserves de places d'aparcament al voltant d'equipaments públics	4/2008					Presentada mesura de govern i aprovada en Plenari. Mesura finalitzada
1.24	5	15	Suport a les entitats que treballen amb persones amb discapacitats que incidint en temes de salut	1/2011					Finalitzat el projecte any 2008 amb la conferència (16/10/08) de les entitats Fatiga Crònica i Fibromialgia.
1.29	5	16	Afavorir la integració laboral de sectors de salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual	1/2011					S'ha treballat amb l'Equip d'Assessorament Laboral de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, un seguit de casos per el seu assessorament en la inserció en la empresa ordinària. Suport al Centre d'Higiene Mental en el CET (quiosc c/ Europa)
12.4	5	17	Consolidar Plataforma de Persones amb Discapacitat	1/2011					Finalitzat el programa previst any 08, amb la sessió formativa/informativa a desenvolupar en el mes de desembre (03/12/08), amb la Jornada de Formació en Salut Mental: Detecció, suport i Utilització de la Xarxa de Salut mental, destinada a tècnics i funcionaris de l'Ajunt. Districte de les Corts. Acord per la cessió d'espai (un hort urbà i 4 plataformes adaptades), a Pedralbes. Acord/conveni de col·laboració entre Districte i Federació per la gestió de casos de mida compensatòria en benefici a la comunitat.

Salut pública

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.23	5	18	Xerrades per difondre la relació esport-salut i especial atenció esport femení	4/2010					En marxa la preparació d'accions informatives i/o formatives 2009
1.26	5	19	Programes de prevenció i promoció de la salut als infants i gent gran prioritàriament	4/2010					Fet:Infància: Ampliació per a l'escola concertada d'una sessió DENTS NETES, SÍ! i en marxa la preparació 2009
1.27	5	20	Jornades sobre Salut	1/2011					Feta la col·laboració ACE activitat prevenció Alzheimer i en marxa Disseny nous projectes Gent Gran 2009
1.28	5	21	Suport a entitats de salut i/o discapacitats oferint espais de trobada i atenció als afectats i als seus familiars	1/2011					S'ha portat a terme activitat de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia i s'estan treballant altres activitats
1.33	5	22	Potenciar programes de salut comunitària	1/2011					Consell Salut presentació Salut i Escola i en marxa la preparació acciona 2009

Drets civils

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització triem / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
1.30	5	23	Impulsar el treball en xarxa de les entitats del sector des del Consell de Drets Civils i Cooperació	1/2011					S'ha dissenyat i executat la Festa "Les Corts Coopera". Valoració molt positiva. I s'està treballant un nou centre d'interès amb les entitats

6 Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Prevenció i Seguretat

Convivència i ciutadania

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
11.1	6	1	Espais lúdics i treball per a la convivència del dte.	1/2011					Activitat convivència espai públic(Parc Infantes), setmana mobilitat.
11.2	6	2	Continuar programes d'intervenció educatives i en benefici comunitat	1/2011					S'ha treballat amb la ludoteca municipal
11.3	6	3	Actuacions de la GU pel control i vigilància del civisme a l'espai públic els caps de setmana	1/2001					S'han realitzat Intervencions Ordenança Civisme i en previsió intervencions cap de setmana nit.

Seguretat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
11.4	6	4	Desenvolupar funcions de policia comunitària i de proximitat de la GU	1/2011					Mantingudes reunions entitats i associacions i en marxa la calendarització de noves sessions de treball-reunions.
11.5	6	5	Continuar convocatòries del Consell de Seguretat i Prevenció i la Meses de coordinació policial	1/2011					S'han portat a terme dues mesos de coordinació policial i convocat un Consell de Seguretat i Prevenció


Mobilitat i Accessibilitat

CODI PAD 2008-2011	codi mesura		mesura descripció executiva	data finalització trim / any	Fet	Marxa	Pendent	Risc	observacions 2n Semestre 2008 supòsits, condicions prèvies, resultats clau obtinguts, aclariments, riscos
10.3.1	6	6	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament en l'àmbit d'Europa-Anglesola	3/2008					En fase d'estudi
10.3.2	6	7	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament en l'àmbit Colònia Castells	3/2008					En fase d'estudi
10.3.3	6	8	Desenvolupar Pla d'Aparcaments: estudi viabilitat nou aparcament Pl. Can Rosés	3/2008					En fase d'estudi
10.6	6	9	Ampliar Àrea Verda del dte (Zona Universitària, Les Corts Sud, Mejia Lequerica i Sant Ramon)	4/2009					Acord amb l'àmbit exacte i en marxa el pintat dels carrers
10.7	6	10	Ordenar i incrementar espais d'estacionament (especialment vehicles dues rodes)	1/2011					Propostes estacionaments motos
10.8	6	11	Disminució de l'accidentalitat i millorar la fluïdesa viària instal·lant més semàfors	1/2011					Feta la proposta ubicació nous semàfors i en marxa els estudis d'accidentalitat i fluïdesa
10.9	6	12	Millorar mobilitat entorns Camp Nou	1/2011					S'està treballant en el marc de l'estudi d'elaboració del Pla de Mobilitat del districte.
10.10	6	13	Continuar amb el Programa d'Educació Viària	1/2011					Alumnes que reben classes de Educació Vial i en programació visites escoles
10.11	6	14	Impulsar obres d'accessibilitat L3 parada Les Corts	4/2009					Iniciades les obres en execució
10.12	6	15	Nous punts Bicing i ampliació d'aparcaments de bicis del dte.	1/2011					Ha finalitzat la implantació de amb un total de 29 parades de Bicing. Finalitzada la implantació dels aparcaments bici programats.
10.13	6	16	Estudiar possible implementació Zona 30	1/2011					S'està treballant la proposta de noves zones
10.14	6	17	Impulsar fórmules per allargar tram i unió de les dues xarxes de tramvia	4/2010					

10.15	6	18	Estudis de mobilitats i Pla de millora del transport públic per a tots els barris, en especial voltats centres educatius	4/2010				S'han iniciat els treballs, finalitzada la Diagnosi tècnica i es va presentar a l'última Comissió de Mobilitat. S'inicien els treballs d'anàlisi i conclusions
10.16	6	19	Demanar estudi de la carència de pas dels vianants als semàfors de l'Av Diagonal	4/2008				S'ha fet l'estudi que queda incorporat en el Pla de Mobilitat del Dte. que s'està elaborant
10.17	6	20	Impulsar accessibilitat parades de bus amb plataformes de formigó, i allà on sigui possible senyalitzar la parada	4/2010				En marxa l'estudi actual
10.18	6	21	Demanar estudi de nou recorregut Nit Bus per la Travessera de les Corts	4/2008				Línia incorporada en el marc del Pla de Mobilitat del transport públic (línia 6.18)
10.20	6	22	Elaborar mapa d'impacte de l'Ordenança de Circulació 15 setembre 2007	4/2010				
10.21	6	23	Mapa-Guia d'aparcaments públics i privats, de residents i de rotació	4/2010				En fase de redacció
10.22	6	24	Promoure l'allargament de la L3 i dels FGC fins Hospital Sant Joan de Déu	1/2011				S'ha presentat a la Comissió de Mobilitat el projecte de la Generalitat d'allargament de la L3 i dels FGC fins a Sant Joan de Déu.
10.4	6	25	Impulsar nova estació de metro L5, intercanviador de tram de Sant Ramon	2/2010				Obres en execució
10.5	6	26	Impulsar nova L9 metro, al seu pas per Les Corts	1/2011				Fet l'informe del traçat i es fa seguiment del projecte i de les obres en execució
10.23	6	27	Estudi de viabilitat de cobriment Ronda de Dalt, per aparcament pels autocars escolars per millorar mobilitat zona	3/2009				Estudi en fase de redacció

4. CONCLUSIONS

De l'estat d'execució del Pla d'Actuació del Districte de Les Corts, durant el 1r any 2008 destaquem que un total 13 mesures estan finalitzades, 147 estan en marxa i tan sols 30 estan pendents d'inici.

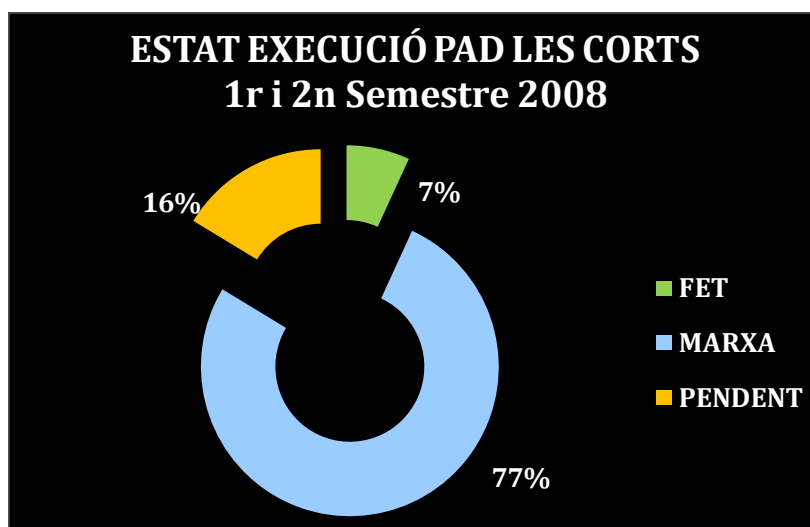

Durant el 2n semestre 2008 s'han incorporat noves mesures dintre del PAD del districte, ja que s'ha aprovat la creació d'un nou espai jove al barri de la Maternitat-Sant Ramon, una Escola Bressol dintre del Ceip Barcelona i una llar-residència per a persones amb discapacitat al c. Anglesola.

Les 11 mesures finalitzades durant aquest segon semestre, complint amb el calendari establert per a la seva execució, són:

- Trasllat i millora de l'hort urbà Torre Melina
- Treballar per desenvolupar l'Estatut del Conseller de Dte.
- Presentar informe 2n semestre 2008
- Nova ubicació Casal de Joves
- Impulsar construcció llar-residència malalts mentals c/ Equador
- Impulsar construcció Centre salut mental i trasllat CAP Montnegre a c/ Equador
- Creació de Oficina Habitatge

- Pla de reserves de places d'aparcament al voltant d'equipaments públics
- Impulsar obres d'accessibilitat L3 parada Les Corts
- Nous punts Bicing i ampliació d'aparcaments de bicis del dte.
- Demanar estudi de la carència de pas dels vianants als semàfors de l'Av Diagonal
